



Alpaka Inc. Switzerland
c/o CsBe
Zieglerstrasse 64
3007 Bern

Projektmanagementplan

Auftraggeber Michal Durik
Projektleiter Martin Reisbacher
Autor Martin Wyss, Kevin Ertl, Martin Reisbacher, Yassin Abdi-Aden
Klassifizierung Intern
Status genehmigt zur Nutzung

Änderungsverzeichnis

Datum	Version	Änderung	Autor
05.03.2026	0.1	Dokument erstellt	Martin Reisbacher Martin Wyss
07.03.2026	1.0	Versionsfreigabe Projektmanagementplan	Martin Reisbacher

Inhaltsverzeichnis

1	Projektbeschreibung.....	2
2	Szenario mit Phasen und Meilensteinen	2
3	Organisation.....	2
4	Projektergebnisstrukturplan	3
5	Szenario mit Projektstrukturplan.....	4
5.1	Phasen, Module, Aufgaben, Ergebnisse, Rollen	4
5.2	Abhängigkeiten	4
6	Prüfplan.....	5
7	Terminplan.....	5
8	Kostenplan	Fehler! Textmarke nicht definiert.
9	Ressourcenplan	5
10	Beschaffungsplan.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
11	Kommunikationsplan	5
12	Reporting	6
13	Vorgaben, Methoden und Werkzeuge.....	6
14	Anhang.....	6
14.1	Qualitätssicherung.....	6
14.2	Risikomanagement.....	7
14.3	Dokumentenmanagement.....	8
14.3.1	Dokumentenablage.....	8

14.3.2	Namenskonventionen.....	8
14.3.3	Versionen von Dokumenten.....	8
14.4	Änderungsmanagement.....	9

1 Projektbeschreibung

Das Projekt "Jumpaka: Legends of the Fluff" ist ein Schulprojekt im Rahmen des Moduls 306. Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines einfachen 2D-Jump-and-Run-Spiels, bei dem eine Spielfigur automatisch läuft und Hindernissen durch Springen ausweichen muss.

Das Spiel wird als Browser- oder .exe-Anwendung entwickelt und soll grundlegende Spielmechaniken wie Punktesystem, steigenden Schwierigkeitsgrad und einfache Kollisionserkennung enthalten.

Das Projekt wird nach der Projektmanagementmethode **HERMES 5.1** durchgeführt und umfasst die Phasen Initialisierung, Konzept, Realisierung und Einführung.

2 Szenario mit Phasen und Meilensteinen

Phase	Meilenstein	Termin
Initialisierung	Projektauftrag genehmigt	08.03.2026
Konzept	Konzept abgeschlossen	14.03.2026
Realisierung	Spiel funktionsfähig	Noch offen
Einführung	Projektabschluss / Präsentation	Noch offen

3 Organisation


Rolle in der Projektorganisation	Name	Kürzel	Funktion / Vertretene Organisationseinheit
<i>Auftraggeber</i>	<i>Michal Durik</i>	<i>MD</i>	<i>Kontroller, Product Owner, Client</i>
<i>Projektleiter</i>	<i>Martin Reisbacher</i>	<i>MR</i>	- <i>Projekt planen (Ziele, Termine, Ressourcen, Kosten)</i> - <i>Team führen und koordinieren</i> - <i>Risiken erkennen und steuern</i> - <i>Stakeholder informieren</i> - <i>Fortschritt überwachen und steuern</i>
<i>Business Analyst</i>	<i>Martin Wyss</i>	<i>MW</i>	- <i>Anforderungen aufnehmen und dokumentieren</i> - <i>Prozesse analysieren und verbessern</i> - <i>zwischen Stakeholdern vermitteln</i> - <i>Lösungen fachlich prüfen</i>

Rolle in der Projektorganisation	Name	Kürzel	Funktion / Vertretene Organisationseinheit
			und begleiten
Entwickler	Kevin Ertl	KE	- Software entwickeln und programmieren - Technische Lösungen konzipieren - Tests durchführen und Fehler beheben - Dokumentation erstellen - Mit Business Analyst und Projektleiter zusammenarbeiten
Tester	Yassin Abdi-Aden	YA	- Testfälle erstellen - Tests durchführen (funktional, technisch, Benutzer-tests) - Fehler dokumentieren - Nachtests durchführen (Re-Tests) - Qualitätssicherung unterstützen

4 Projektergebnisstrukturplan

Mindmap Darstellung

Der Projektergebnisstrukturplan ist die hierarchisch gegliederte Darstellung des Projektinhalts.

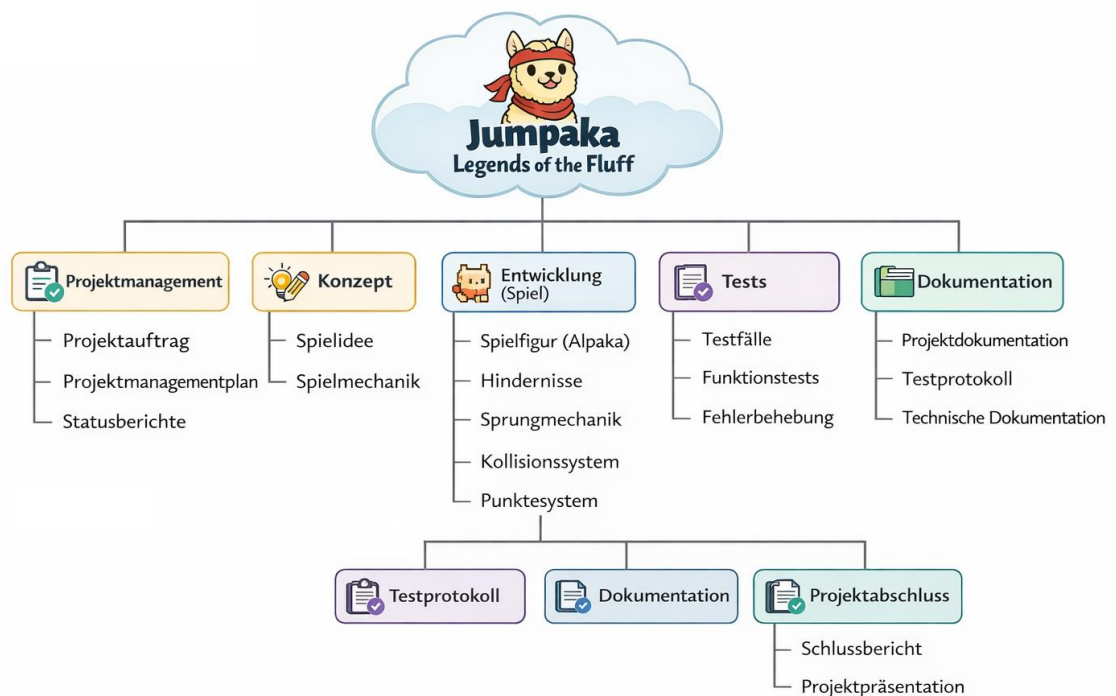

5 Szenario mit Projektstrukturplan

5.1 Phasen, Module, Aufgaben, Ergebnisse, Rollen

Phase 1: Initialisierung

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Projektstart	Projektidee definieren	Projektbeschreibung	Projektleiter
Planung	Projektauftrag erstellen	Projektauftrag	Projektleiter
Organisation	Rollen und Verantwortlichkeiten festlegen	Projektorganisation	Projektleiter

Phase 2: Konzept

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Spielkonzept	Spielidee definieren	Spielkonzept	Business Analyst
Gameplay	Spielmechaniken planen	Gameplay-Dokument	Business Analyst
Technik	Technisches Konzept definieren	Technisches Konzept	Entwickler

Phase 3: Realisierung

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Entwicklung	Spielfigur programmieren	Spielfigur funktioniert	Entwickler
Gameplay	Hindernisse implementieren	Hindernissystem	Entwickler
Mechanik	Sprunglogik programmieren	Sprungmechanik	Entwickler
Punkte	Punktesystem implementieren	Score-System	Entwickler

Phase 4: Einführung

Modul	Aufgabe	Ergebnis	Rolle
Tests	Spiel testen	Testprotokoll	Tester
Fehlerbehebung	Bugs korrigieren	Fehlerfreie Version	Entwickler
Abschluss	Dokumentation erstellen	Projektdokumentation	Projektteam
Präsentation	Projekt vorstellen	Projektpräsentation	Projektleiter

5.2 Abhängigkeiten

Projekt / Vorhaben	Abhängigkeit	Termin	Auswirkungen	Ansprechperson
Spielentwicklung	Konzept muss abgeschlossen sein	14.03.2026	Entwicklung kann sonst nicht starten	Projektleiter
Tests	Spiel muss funktionsfähig sein	nach Realisierung	Ohne Tests keine Einführung	Tester
Präsentation	Projektabschluss	Projektende	Voraussetzung für Bewertung	Projektleiter

6 Prüfplan

Phase / Ergebnis	Prüfmethode	Verantwortlich	Prüfer	Termin	Status
Projektauftrag	<i>Review</i>	Projektleiter	Auftraggeber	08.03.2026	offen
<i>Konzept</i>	<i>Review</i>	<i>Auftraggeber</i>	<i>Projektleiter</i>	<i>14.03.2026</i>	offen
<i>Spiel</i>	<i>Funktionstest</i>	<i>Entwickler</i>	<i>Tester</i>		offen
<i>Schlussbericht</i>	<i>Review</i>	<i>Projektleiter</i>	<i>Auftraggeber</i>		offen

7 Terminplan

Detailplanung für aktuelle bzw. nächste Projektphase.

Phase	Termin
Initialisierung	08.03.2026
Konzept	14.03.2026
Realisierung	Noch offen
Einführung	Noch offen

8 Ressourcenplan

Personalressourcen

Phase	Geplant	Total
<i>Initialisierung</i>	<i>Pro Person 10h</i>	<i>40h</i>
<i>Konzept</i>	<i>Pro Person 10h</i>	<i>40h</i>
<i>Realisierung</i>	<i>Pro Person 20h</i>	<i>80h</i>
<i>Einführung</i>	<i>Pro Person 20h</i>	<i>80h</i>
<i>Total</i>		<i>200h</i>

Sachmittel

Räume, IT-Infrastruktur, Spezifische Software, etc.

9 Kommunikationsplan

Adressat der Information	Kommunikationsverantw.	Inhalt	Ziel	Mittel / Medium	Termin
<i>Alle Mitarbei-</i>	<i>Auftraggeber</i>	<i>Einführung</i>	<i>Alle Mitarbeitenden</i>	<i>PDF /</i>	<i>21.02.2026</i>

tenden		ins Projekt	kennen Vorgehen, Termine und Supportorganisation	Power Point, Github und teams	
--------	--	-------------	---	----------------------------------	--

10 Reporting

Ergebnis	Periodizität	Verantwortlich	Empfänger	Termin
Arbeitsplan	Täglich	Team Alpaka	Auftraggeber	Wöchentlich
Phasenbericht/ Projektentscheid	Phasenende	Team Alpaka	Auftraggeber	offen

11 Vorgaben, Methoden und Werkzeuge

Titel	Vorgabe / Methode / Werkzeug	Version
Projektmanagement	HERMES	HERMES 5.1

12 Anhang

12.1 Qualitätssicherung

Das Testen wird im Testkonzept festgelegt.

Die Prüfungen werden im Kapitel Prüfplan des Projektmanagementplans festgelegt.

Die folgenden Prüfmethoden werden im Projekt eingesetzt.

Prüfmethode	Beschreibung
Schriftlicher Review (SR)	Das Ergebnis wird den Prüfern per Email zugestellt. Diese prüfen das Ergebnis unabhängig voneinander und erstellen einen Prüfbericht mit den Befunden. Die Befunde werden vom Autor korrigiert oder mit einer schriftlichen Begründung zurückgewiesen, welche dem Prüfer per Email zugestellt wird.
Mündlicher Review (MR)	In einem Review-Meeting werden die schriftlichen Befunde besprochen. Dabei werden die nötigen Anpassungen / Massnahmen beschlossen, Verantwortlichen zugewiesen und terminiert. Ein schriftlicher Review (SR) ist immer Basis für einen mündlichen Review (MR). Als Resultat eines MR entsteht ein Reviewprotokoll, das von MR-Teilnehmern unterschrieben werden muss.
Walk-Trough (WT)	Ein Walk-Through ist eine weniger formale Prüfung als ein Review. Indem durch die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorliegenden Resultate gegangen wird, versucht sich der Prüfende ein Bild über den aktuellen Stand der Arbeiten zu verschaffen.

Werden Resultate durch eine Vernehmlassung von Fachvertretern abgenommen, wird diese Prüfung mittels eines schriftlichen Reviews durchgeführt.

12.2 Risikomanagement

Die Projektrisiken werden im Statusreport geführt.

Um Risiken beurteilen zu können, muss jedes Risiko in Bezug auf seine Eintretenswahrscheinlichkeit und der Auswirkungsgrad beurteilt werden. Hier werden die Variablen dazu festgelegt.

Bewertungsskale Eintretenswahrscheinlichkeit


Bewertung	Beschreibung der Eintretenswahrscheinlichkeit
1 = niedrig	<i>unwahrscheinlich, bzw. unter 20%</i>
2 = mittel	<i>mässig wahrscheinlich, bzw. 20-50%</i>
3 = hoch	<i>hoch wahrscheinlich, bzw. über 50%</i>

Bewertungsskala Auswirkungsgrad

Bewertung	Auswirkung auf Projekt- ergebnis	Auswirkung auf Termin	Auswirkung auf Kosten
1 = niedrig	<i>Geringfügige Mängel</i>	<i>bis 1 Monat, bzw. geringfügig</i>	<i>keine</i>
2 = mittel	<i>Wesentliche Mängel</i>	<i>1-3 Monate bzw. wesentlich</i>	<i>5-20% bzw. wesentlich</i>
3 = hoch	<i>Gravierende Mängel</i>	<i>über 3 Monate bzw. gravierend</i>	<i>über 20% bzw. gravierend</i>

Aus diesen Werten ergeben sich anschliessend die Koordinaten, um das Risiko in der Matrix abzubilden. Mit dem Pfeil (Bsp. Risiko 2) kann die Veränderung zur letzten Beurteilung aufgezeigt werden.

Risikomatrix

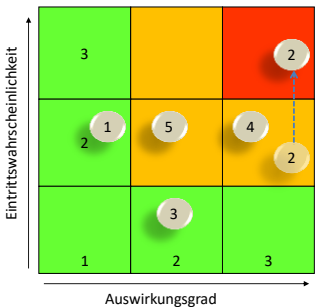

Die identifizierten und bewerteten Projektrisiken werden analog der nachfolgenden Tabelle im Projektstatusbericht geführt. Für jedes Risiko werden die Massnahmen geplant.

Risiken							
Nr	A	EW	RZ	Beschreibung	Massnahme	Verantwortlich	Termin
1	3	3	9	Spiel funktioniert technisch nicht korrekt	Frühe Prototypen entwickeln und regelmässig testen	Entwickler	Realisierung
2	2	2	4	Zeitverzug durch technische Probleme	Arbeitsplan anpassen und Aufgaben priorisieren	Projektleiter	laufend
3	2	3	6	Teammitglied fällt aus	Aufgaben im Team neu verteilen	Projektleiter	bei Bedarf
4	1	2	2	Kleine Bugs im Spiel	zusätzliche Testphase durchführen	Tester	vor Einführung

12.3 Dokumentenmanagement

12.3.1 Dokumentenablage

Tools, Ablageort, Zugriffsverwaltung

12.3.2 Namenskonventionen

Damit projektbezogene Dokumente eindeutig und einfach identifiziert werden können, werden die folgenden Namenskonventionen für Dateinamen angewendet:

Nummerierung_Dokumentbezeichnung.Dateityp

Beispiel:

01. Projektauftrag.doc

12.3.3 Versionen von Dokumenten

Änderungen an Dokumenten sollen im Änderungsverzeichnis des Dokuments aufgeführt werden.


Verwendung von Versionsnummern

Versionsnummern V0.1, V0.2, V0.3....V0.9 bezeichnen Versionen von Dokumenten in Arbeit.

Versionsnummer V1.0 ist die erste abgenommene Version des Dokuments.

Versionsnummer V1.1 ist die erste geänderte Version nach der Abnahme.

Versionsnummer V2.0 ist die zweite abgenommene Version des Dokuments.

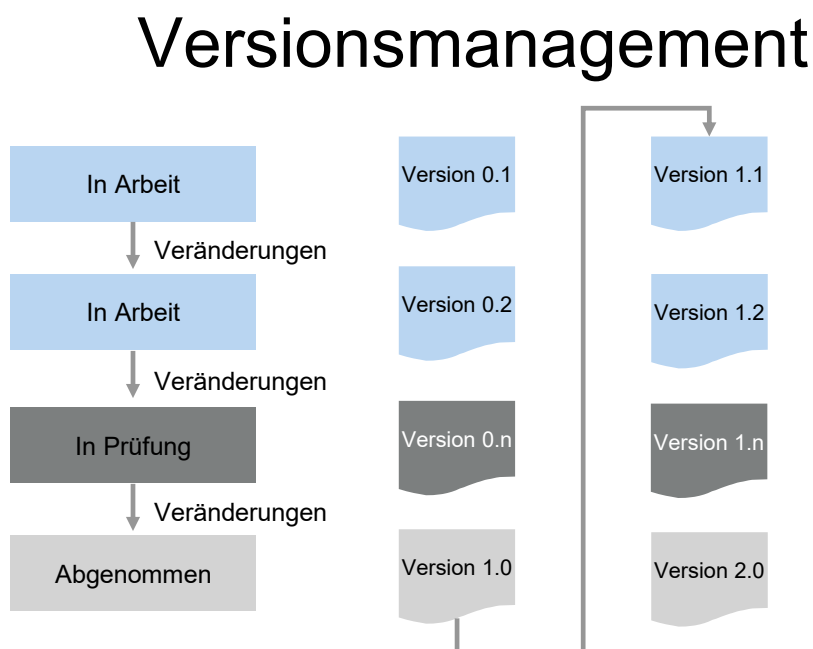

Dokumente mit Zeitbezug

Dokumente mit einem klaren Zeitbezug enthalten das Datum im Dateinamen.

Beispiel eines Sitzungsprotokolls:

Protokoll-Kernteammeeting-2011-12-05.doc

Bei Verwendung des Datums im Dateinamen wird immer das Format JJJJ-MM-TT verwendet, damit Dokumente in Verzeichnissen sortiert angezeigt werden.

12.4 Änderungsmanagement

